



沙颍河城区段综合治理项目一期工程稳步推进

水清堤固幸福河 路通岸绿如画来

□ 晚报记者 张劲松 文/图

2013 年 12 月 31 日上午，随着市委书记徐光下达开工令，沙颍河城区段治理项目一期工程开工建设。近日，市政府召开了沙颍河城区段治理工作推进会。如今，项目进展如何？3 月 3 日，周口晚报记者进行了现场探访。

建设场面如火如荼

3 月 3 日上午，在市沙颍河城区段治理指挥部相关工作人员的带领下，周口晚报记者来到施工现场。在沙颍河城区牛滩段，绿化工人正在整理好的堤岸上栽植绿化树木，只见他们挖坑、抬树、培土、浇水……一派热火朝天的劳动场面。堤岸上，一棵棵绿树站成队、排成行、连成片，为沙颍河再添新绿（图一）。

在周口市区武盛大道沙颍河桥西侧北岸一处景观工程施工现场，挖掘机轰鸣着，各种工程车辆来往穿梭，工地上人头攒动，一派繁忙的景象（图二）。工作人员介绍，这里是景观工程景观节点之元帅风骨施工现场。在沙颍河北岸的一处护坡工地，两台挖掘机也在紧张施工，随着挖掘机将一铲一铲的黄土挖上河堤，堤坡看上去越发整齐。

市沙颍河综合治理指挥部办公室副主任崔建军介绍，景点工程景观节点之元帅风骨已开挖道路 1250 米，并进行了部分回填，造景回土 16500 多方，景点工程景观节点之铁路风情造景回土 38200 多方。沙颍河南岸的堤南路北正在塑造微地形，已累计拉土 65 万方。

工程建设稳步推进

据了解，沙颍河城区段治理工程项目规划总长 20.6 公里，西起龙源路，东至大广高速，包括堤防工程、道路工程、景观工程、桥梁工程和旧城区改造工程。正在建设的一期工程，西起周口大道，东至武盛大道，全长 5 公里。工程建设总投资约 11.08 亿元。

崔建军介绍，目前治理工程各方面都在稳步推进。堤防加固工程已累计堆土 50 余万方，筑堤覆表 5000 多米，其中，陈滩东至武盛大道段基本完成，王含庄至郭埠口段、郑洼东至牛滩西段接近尾声，周口港西至周口大道段、郭洼西至周口港东段、赵寨西至周口大道段正在堆土固堤，两岸已完成总工程量的 41%。

道路工程正在施工。滨河路给排水管道完成 2900 米，占总量的 56.3%；雨水管道完成 2900 米，占总量的 59.3%；污水管道完成 980 米，占总量的 24.5%；砌筑给水井 19 眼，砌筑雨水井 62 眼，砌筑污水井 37 眼；道路路床开挖 600 米，占比 15%；已完成总工程量的 14%。颍河路雨水管道完成 935 米，占总量的 19.5%；污水管道完成 840 米，占总量的 18%；砌筑雨水井 23 眼，砌筑污水井 21 眼；路基开挖 800 米，占比 17.8%；已完成总工程量的 8.3%。

颍河路下穿周口大道工程施工方案已定，拟进行封闭施工，辅助道路正在铺设，已经筑路堆土约 3000 方，清淤换填土 1064 方，即将施工。

水清岸绿美景如画


如火如荼的建设场面让市民充满期

待。崔建军介绍，整个项目建成后，沙颍河两岸将形成独具周口特色的生态长廊、文化长廊、风景长廊和财富长廊，不仅可以改善民生、提升城市形象，还能增强城市防洪排涝能力、加快通江达海航运开发建设，对促进经济发展、加快周口新区乃至整个中心城区发展建设都具有十分重要的意义。

广大市民关注的景观工程规划，有关部门已根据城市整体布局和沿河用地规划，对全流域进行功能和景观的分区、控制。通过建设滨水绿化公园、城市湿地、休闲文化广场、绿色慢行道等公共开放空间，进一步提升水岸环境质量，串联城市重要区域，聚集人气，提高城市认识度，创造具有特色和吸引力的滨水环境，同时通过连贯优美的滨水空间塑造周口城市形象。打造成四区七段三十六景，即湿地农艺区、古韵溯源区、滨水新城区、现代港务区；湿地农艺段、古韵凤凰段、候鸟保护段、群艺风情段、田园游娱段、现代主题段、河运文化段；苇海长廊、听涛小筑、篱落炊烟、虹桥灯火、长龙卧波、颍畔梨园、渔鼓道情、平湖秋月、四季花海、揽秀芳洲等。

崔建军表示，沙颍河城区段治理工程项目指挥部和东新区、周口港口物流产业集聚区将督促施工单位尽可能多上机械和人力，把能够施工的区域全面打开、全面进场，迅速掀起施工高潮；进一步优化环境，确保施工有序推进；拓宽融资渠道，积极融资，保证工程建设资金需要，确保工程如期完工。


不久的将来，一条集生态长廊、文化长廊、风景长廊、休闲长廊综合功能于一体的中心城区段水清岸绿的沙颍河景观带将展现在周口人民面前。



图一



图二

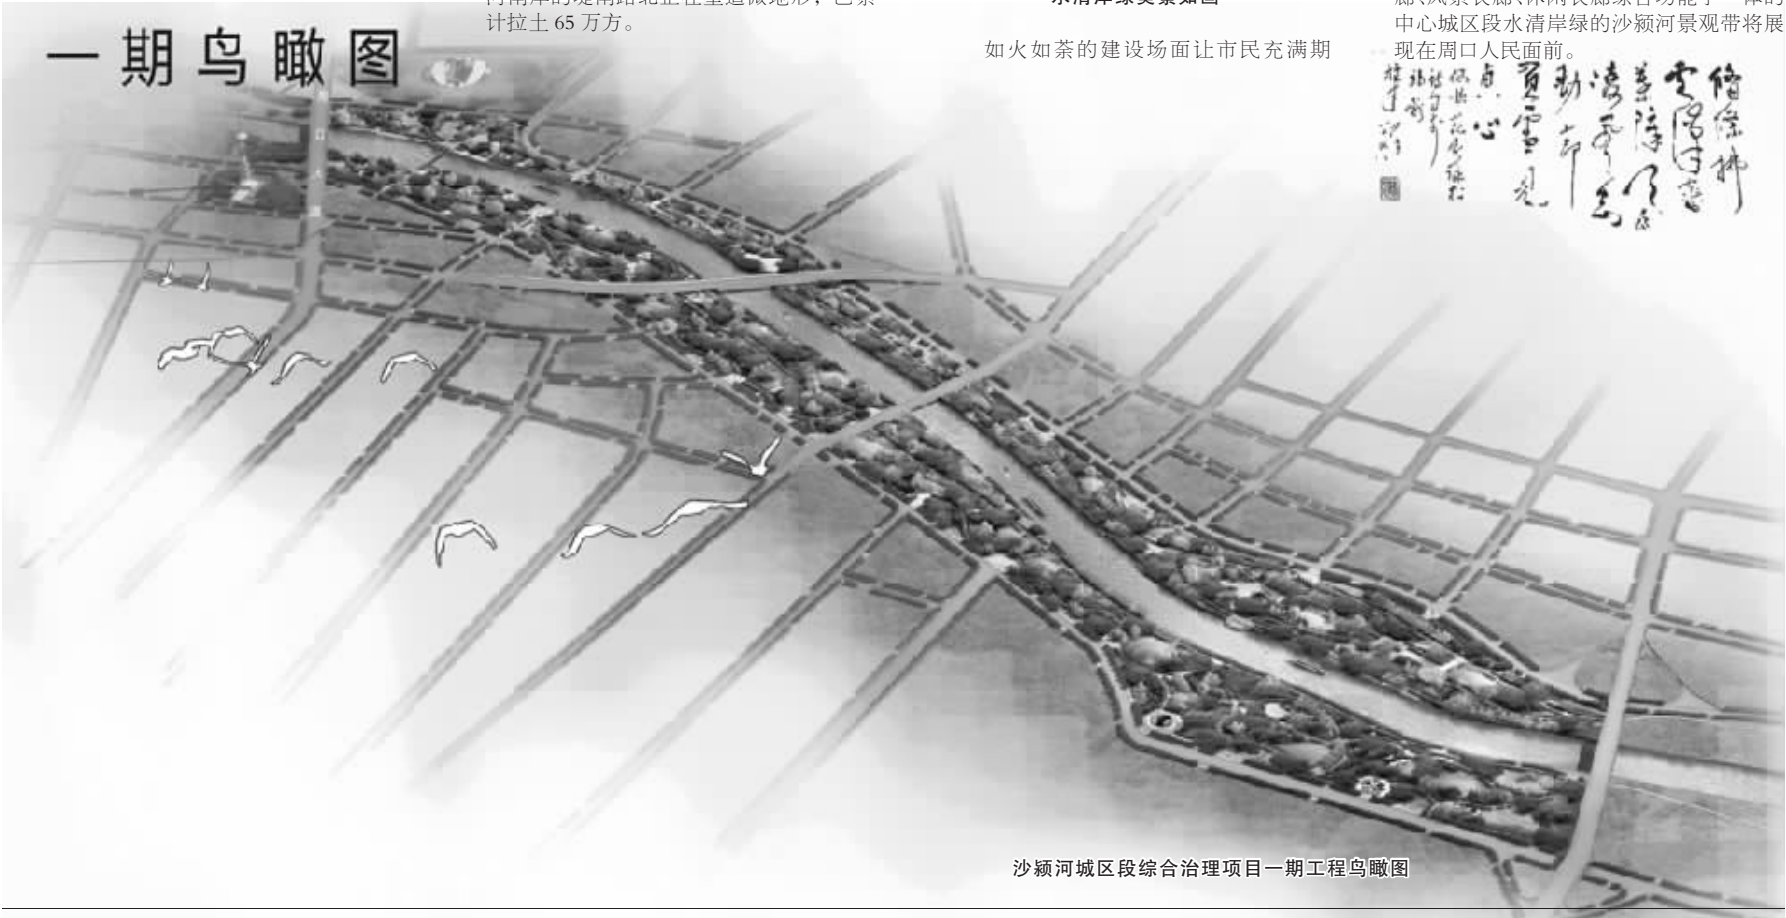

沙颍河城区段综合治理项目一期工程鸟瞰图
